



OBČINA RENČE-VOGRSKO

NADZORNI ODBOR OBČINE RENČE-VOGRSKO

**POROČILO O PREGLEDU INVESTICIJE KANALIZACIJA RENČE-VOGRSKO - 1. FAZA NA
PRORAČUNSKI POSTAVKI 15002019 ZA LETI 2023 IN 2024**

Vsebina:

- 1 Uvod
- 2 Ugotovitve nadzora
- 3 Priporočila in predlogi

1. UVOD

Nadzorni odbor Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju NO) je na podlagi 49.člena Statuta občine Renče-Vogrsko in 21. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko ter v skladu z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l.23/09) na svoji seji dne 16.2.2024 sprejel Letni program nadzora nadzornega odbora Renče-Vogrsko za leto 2024, katerega del je tudi Sklep o nadaljevanju nadzora za investicijo Kanalizacija Renče-Vogrsko - 1. faza na postavki 15002019.

1.1. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

Predmet letnega nadzora je bilo nadaljevanje pregleda investicije Kanalizacija Renče-Vogrsko - 1. faza na postavki 15002019 za leti 2023 in 2024. Nadzor je bil opravljen pri odgovorni osebi:

- **Saši Lavrenčiču**, višjemu svetovalcu za infrastrukturo in gospodarske javne službe,

nadaljevanje nadzora pa pri odgovorni osebi:

- **Tariku Žigonu**, županu in
- **Mojci Fornazarič**, zunanji sodelavki.

1.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Izvedba nadzora temelji na:

- 32. členu Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. št. 94/07-UPB2)
- 47. členu Statuta Občine Renče - Vogrsko z dne 27.3.2018
- 21. in 22. členu Poslovnika Nadzornega odbora Občine Renče – Vogrsko z dne 8.10.2020
- Letnem programu nadzora NO Občine Renče – Vogrsko za leto 2023, sprejetega na seji dne 13.2.2023 in Letnem programu nadzora NO Občine Renče - Vogrsko za leto 2024, sprejetega na seji 16.2.2024

1.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

- Sklep NO št: 4/2023 z dne 25.9.2023 in št. 3/2024 z dne 15.5.2024

1.4. Namen in cilj nadzora ter trajanje nadzora

Namen in cilj nadzora je bil pregledati izvajanje investicije Kanalizacija Renče-Vogrsko - 1. faza na postavki 15002019. Nadzor je bil izveden dne 3.10.2023 s predajo dotedanje dokumentacije, nadaljevanje nadzora pa 29.5.2024 v prostorih Občine Renče -Vogrsko. Dodatna dokumentacija za dokončanje nadzora je bila posredovana dne 29.11.2024.

1.5 Izvedba nadzora

Nadzor sta opravila:

- Gregor Kopal, vodja nadzorne skupine,
- Radovan Rusjan, član nadzorne skupine.

1.6 Temeljni predpisi

Pri nadzoru so bili upoštevani:

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 91/15,ZJN-3)
- Navodilo o javnem naročanju v Občini Renče-Vogrsko z dne 12.3.2010,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l.št. 55/08)



OBČINA RENČE-VOGRSKO

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. št. 60/06, 54/10, 27/16),
- Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leti 2023 in 2024

2. UGOTOVITVE NADZORA

Pri nadzoru je bila pregledana dokumentacija za investicijo Kanalizacija Renče-Vogrsko - 1. faza ter vpliv investicije na proračun, vse z namenom, da se preveri skladnost poslovanja z veljavnimi predpisi.

Na začetku nadzora je višji svetovalec iz oddelka za okolje in prostor razložil, da investicijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Iz Kohezijskega sklada se je financiral tisti del skupnega javnega naročila, ki se je nanašal na vodovod (Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek). Drugi del skupnega javnega naročila, ki se nanaša na kanalizacijo in ki je predmet obravnave predmetnega poročila (projekt Kanalizacija Renče-Vogrsko - 1. faza), pa je bil sofinanciran s sredstvi mehanizma za okrevanje in odpornost s strani Evropske unije – Next Generation EU. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.

2.1 Povzetek dogajanja na projektu pred nadzorovanim obdobjem

Nadalje je razložil, da se je investicija začela 1.12.2021 z oddajo sklepa o začetku postopka oddaje JN za izvedbo GOI del za projekt Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek in izgradnja kanalizacije Renče-Vogrsko – 1. faza in s pooblastilom Občine Renče-Vogrsko podjetju Vodovod in kanalizacija Nova Gorica za vse faze od priprave dokumentacije do priprave izbora in odločitve. (slika).

Datum: 01.12.2021

Na podlagi 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18) izdajam:

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA ZA IZVEDBO GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK IN IZGRADNJA KANALIZACIJE RENČE – VOGRSKO - 1. FAZA

Naročnik	OBČINA RENČE-VOGRSKO Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Pooblastilo	Skladno s (1) in (2) odstavkom 33. člena ZJN-3 (priložnostno skupno naročanje) Občina Renče-Vogrsko za SKLOP 1 za izvedbo projekta pooblašča javno podjetje Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica , za izvedbo in odločanje v postopku tega naročila. Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica , bo kot pooblaščenec to naročilo izvedel v imenu in za račun naročnika OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga . Občina Renče-Vogrsko pooblašča javno podjetje Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica , za izvedbo naslednjih faz: <ul style="list-style-type: none">- Priprava dokumentacije- Objava javnega naročila- Podajanje pojasnil- Odpiranje ponudb- Poziv za dopolnitev ponudb- Ocenjevanje ponudb- Priprava poročila- Priprava izbora in odločitve



OBČINA RENČE-VOGRSKO

Projekt je bil na portalu za javno naročanje objavljen pod številko JN008264/2021-B01 dne 7.12.2021, s popravki dne 27.12.2021.

Odpiranje ponudb se je izvedlo 19.1.2022. Ponudnik je oddal ponudbo in pripadajočo dokumentacijo v roku. Ponudnik je KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica v skupnem nastopu s partnerjem GINEX INTERNATIONAL d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica. Višna ponudbe je 5.751.548,98 EUR z DDV.

Dne 25.2.2022 in 2.3.2022 je bilo izvedeno ocenjevanje prispelih ponudb. Pristojna za ocenjevanje Mitja Gorjan in Ana Vuk sta ugotovila, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna, saj za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da je ponudba prispela pravočasno, da pri ponudbi ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, da naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in da ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika ter da je glede na razpisana merila najugodnejša oziroma edina ponudba. Dne 2.3.2022 je župan zato podpisal odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku.

Dne 15.3.2022 sta Občina Renče-Vogrsko in KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.o.o. podpisala in sklenila **pogodbeni sporazum za izvedbo GOI del za projekt Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek in izgradnja kanalizacije Renče-Vogrsko – 1. faza** (v nadaljevanju Pogodbeni sporazum) za pogodbeni znesek v skupni višini 5.322.604,30 EUR z DDV. Čas dokončanja del je osemsto triinšedemdeset (873) dni (maksimalni čas sklenitve od podpisa pogodbe do uvedbe v delo - 28 dni, rok za dokončanje del - štiristoosemdeset (480) dni in rok za reklamacijo napak 365 dni). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna najmanj devetsto triinšestdeset (963) dni od podpisa pogodbe (od tega je rok za uvedbo v delo - 28 dni, rok za dokončanje del štiristo osemdeset (480) dni ter rok za reklamacijo napak 365 dni, dodatni rok - 90 dni). Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavna štiri (4) leta in trideset (30) dni od izdaje Potrdila o izvedbi.

Dne 12.7.2022 sta Občina Renče-Vogrsko in Ministrstvo za okolje in prostor podpisala in sklenila **Pogodbo o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 za projekt Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek**, številka 2550-22-430027. Pogodbena vrednost po izvajalski pogodbi št. 3551-003/2020-64 znaša 5.322.604,30 EUR z DDV, predmet sofinanciranja pa je izvedba GOI del, storitve inženiringa po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po GZ-1 ter storitve obveščanja javnosti o izvajanju za projekt Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek – podsklop Vodovod.

Nadzornika in nadzorovani osebi so se strinjali, da tako v prejšnjem odstavku omenjena pogodba, kot vsi trije po priloženi dokumentaciji njej pripadajoči aneksi med Občino Renče-Vogrsko in Ministrstvom za okolje in prostor ne bodo predmet nadzora in da se bo nadzor izvajal samo za del Kanalizacija Renče-Vogrsko – 1. faza za leti 2023 in 2024, kot izhaja iz navedenih sklepov NO.

Dne 29.9.2022 sta Občina Renče-Vogrsko in KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.o.o. podpisala in sklenila Ugotovitveni aneks št. 1 k Pogodbenemu sporazumu, v katerem pogodbeni stranki ugotavljata, da je bila po podpisu pogodbe ugotovljena računsko napaka, ki vpliva na skupno pogodbeno vrednost, ki po tem aneksu znaša 5.312.602,33 EUR z DDV.



OBČINA RENČE-VOGRSKO

2.2 Povzetek dogajanja na projektu v nadzorovanem obdobju za leti 2023 in 2024

Dne 13.1.2023 sta Občina Renče-Vogrsko in KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.o.o. podpisala in sklenila Aneks št. 2 k Pogodbenemu sporazumu, v katerem pogodbeni stranki ugotavljata, da se zaradi zamenjave zaposlitve Mitje Gorjana, dosedanjega predstavnika naročnika, s tem aneksom določi nova predstavnica naročnika in sicer Mojca Lapajne, za obdobje od 1.1.2023 dalje.

Dne 26.7.2023 sta Občina Renče-Vogrsko in KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.o.o. podpisala in sklenila Aneks št. 3 k Pogodbenemu sporazumu, v katerem pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik s strani izvajalca prejel Najavo zahtevka in Zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka zaradi razlogov, na katere kot izvajalec nima vpliva. Pogodbeni stranki soglašata, da se z omenjenim aneksom spremeni peti člen Pogodbenega sporazuma, ki se po novem glasi:

Čas dokončanja del devetsto devetinpedeset (959) dni (čas od podpisa pogodbe do uvedbe v delo (štiriindvajset) 24 dni, rok za dokončanje del je petsto sedemdeset (570) dni in rok za reklamacijo napak je tristo petinšestdeset (365) dni).

ter šesti člen Pogodbenega sporazuma, ki se po novem glasi:

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna najmanj tisoč devetinštirideset (1049) dni od podpisa pogodbe (od tega je rok za uvedbo v delo štirinindvajset (24) dni, rok za dokončanje del je petsto sedemdeset (570) dni, rok za reklamacijo napak je tristo petinšestdeset (365) dni ter dodatni rok devetdeset (90) dni). Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavna štiri (4) leta in trideset (30) dni od izdaje Potrdila o izvedbi.

Dne 30.10.2023 sta Občina Renče-Vogrsko in KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.o.o. podpisala in sklenila Aneks št. 4 k Pogodbenemu sporazumu, v katerem pogodbeni stranki ugotavljata, da se zaradi navedenega v prejšnjem aneksu določi vmesni rok in sicer rok za dokončanje GOI del, posledično pa se določi tudi obveznost plačila pogodbene kazni zaradi zamude roka za dokončanje GOI del. Pogodbeni stranki soglašata, da se z omenjenim aneksom spremeni peti člen Pogodbenega sporazuma, ki se po novem glasi:

Čas dokončanja del je tisoč sto dvanajst (1112) dni (čas od podpisa pogodbe do uvedbe v delo (štiriindvajset) 24 dni, rok za dokončanje del je sedemsto triindvajset (723) dni, znotraj katerega je rok za dokončanje GOI del petsto sedemdeset (570) dni, rok za reklamacijo napak je tristo petinšestdeset (365) dni).

ter šesti člen Pogodbenega sporazuma, ki se po novem glasi:

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna najmanj tisoč dvesto dva (1202) dni od podpisa pogodbe (od tega je rok za uvedbo v delo štirinindvajset (24) dni, rok za dokončanje del sedemsto triindvajset (723) dni, rok za reklamacijo napak je tristo petinšestdeset (365) dni ter dodatni rok devetdeset (90) dni). Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavna štiri (4) leta in trideset (30) dni od izdaje Potrdila o izvedbi.

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da se podčlen 8.7 Pogodbena kazen Posebnih pogojev uporablja tudi v primeru zamude izvajalca z dokončanjem GOI del in sicer glede na rok za dokončanje GOI del, določenem v tem aneksu. V tem primeru mora izvajalec v skladu s Splošnimi pogoji Pogodbenega sporazuma naročniku plačati pogodbeno kazen za vsak dan, ki poteče med rokom za dokončanje GOI del in dejanskim dokončanjem GOI del.

Dne 2.11.2023 sta Občina Renče-Vogrsko in Ministrstvo za naravne vire in prostor podpisala Pogodbo o sofinanciranju za operacijo »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Kanalizacija Renče-Vogrsko – 1. faza, številka pogodbe: 2560-23-402022. Iz pogodbe izhaja, da se projekt sofinancira v višini 50% upravičenih stroškov iz sredstev sklada NOO oziroma 60% upravičenih stroškov iz sredstev sklada NOO, če sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode leži na ali pa ima vpliv na



OBČINA RENČE-VOGRSKO

območje Nature ali vodovarstveno območje, z omejitvami kot jih določa predmetni javni razpis, kot opredeljeno v vlogi in odločbi. Vrednost celotnega projekta znaša 2.574.426,89 EUR brez DDV. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo sofinanciralo projekt v višini do 1.000.000,00 EUR. Sofinancer ima pravice porabe po tej pogodbi zagotovljene v proračunu RS za leto 2023, na proračunski postavki 221159, številka projekta 2560-23-0078 – NOO Kanalizacija Renče – Vogrsko – 1. faza. Nadalje iz pogodbe izhaja tudi, da je obdobje upravičenosti stroškov od 20.2.2020 do 30.6.2026. Ocenjena pogodbeno dinamično izplačil iz Sklada NOO po tej pogodbi je po letih umeščena v leto 2023 v celotnem znesku. Iz pogodbe izhaja tudi, da mora Investitor ob zaključku investicije dosegati naslednje parametre investicije iz potrjene vloge:

- Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji je potrebno doseči energijsko nevtralnost sistema oziroma nobene dodatne porabe energije. Izjemoma je z nadgradnjo čistilne naprave (ČN) dopustno, da se povprečna poraba električne energije zmanjša vsaj za 10 %.
- Izdelan energijski certifikat pooblaščenice družbe, ki mora biti skladen z izračuni in izkazi v vlogi ali spremljajoči dokumentaciji, je obvezna priloga ob zaključku investicije.
- Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode morajo biti v upravljanju javnih gospodarskih služb (JGS).
- Pridobljeno uporabno dovoljenje.

Najkasneje en mesec po roku izvedbe 31.12.2024 je investitor dolžan podati izjavo, da je s projektom zaključil in da so finančne obveznosti iz te pogodbe zaključene. Investitor mora vsa dokazila predložiti sofinancerju do 31.12.2024.

Dne 26.2.2024 sta Občina Renče-Vogrsko in Ministrstvo za naravne vire in prostor podpisala Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju za operacijo »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Kanalizacija Renče-Vogrsko – 1. faza, iz katerega izhaja, da je predmet aneksa sprememba dinamike črpanja, sprememba skrbnika pogodbe in odstotek sofinanciranja. Sofinancer ima pravice porabe po tej pogodbi zagotovljene v proračunu RS za leto 2024, na proračunski postavki 221159, številka projekta 2560-23-0078 – NOO Kanalizacija Renče – Vogrsko – 1. faza. Ocenjena pogodbeno dinamično izplačil iz Sklada NOO po tej pogodbi je po letih umeščena v leto 2024 v celotnem znesku. Za spremljanje, nadzor in izvajanje te pogodbe sta pooblaščenca Elvis Bilić na strani sofinancerja in Beti Čufer na strani investitorja.

Dne 29.3.2024 sta Občina Renče-Vogrsko in KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.o.o. podpisala in sklenila Aneks št. 5 k Pogodbenemu sporazumu, v katerem pogodbeni stranki ugotavljata, da se ta aneks sprejema zaradi podaljšanja roka dokončanja del. Zomenjenim aneksom se spremeni peti člen Pogodbenega sporazuma, ki se po novem glasi:

Čas dokončanja del je tisoč dvesto štiriintrideset (1234) dni (čas od podpisa pogodbe do uvedbe v delo (štiriindvajset) 24 dni, rok za dokončanje del je osemsto petinštirideset (845) dni, znotraj katerega je rok za dokončanje GOI del petsto sedemdeset (570) dni, rok za reklamacijo napak je tristo petinšestdeset (365) dni).

ter šesti člen Pogodbenega sporazuma, ki se po novem glasi:

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna najmanj tisoč tristo štiriindvajset (1324) dni od podpisa pogodbe (od tega je rok za uvedbo v delo štirinindvajset (24) dni, rok za dokončanje del osemsto petinštirideset (845) dni, rok za reklamacijo napak je tristo petinšestdeset



OBČINA RENČE-VOGRSKO

(365) dni ter dodatni rok devetdeset (90) dni). Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavna štiri (4) leta in trideset (30) dni od izdaje Potrdila o izvedbi.

Dne 18.10.2024 je župan podpisano izjavo ob zaključku projekta Kanalizacija Renče-Vogrsko – 1. faza s št. 3551-0003/2020-398 posredoval Ministrstvu za naravne vire in prostor in s tem potrdil, da so bila GOI dela na projektu opravljena v roku.

Številka: 3551-0003/2020-398
Datum: 18.10.2024


IZJAVA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA »KANALIZACIJA RENČE-VOGRSKO – 1. FAZA«

Spodaj podpisani župan občine Renče - Vogrsko, Tarik Žigon, izjavljam, da je projekt KANALIZACIJA RENČE-VOGRSKO – 1. FAZA z dnem 18.10.2024 zaključen in da so zaključene tudi finančne obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju št. 2560-23-402022.

Tarik Žigon
župan



- Poslati:
- Ministrstvo za naravne vire in prostor
 - v zadevo

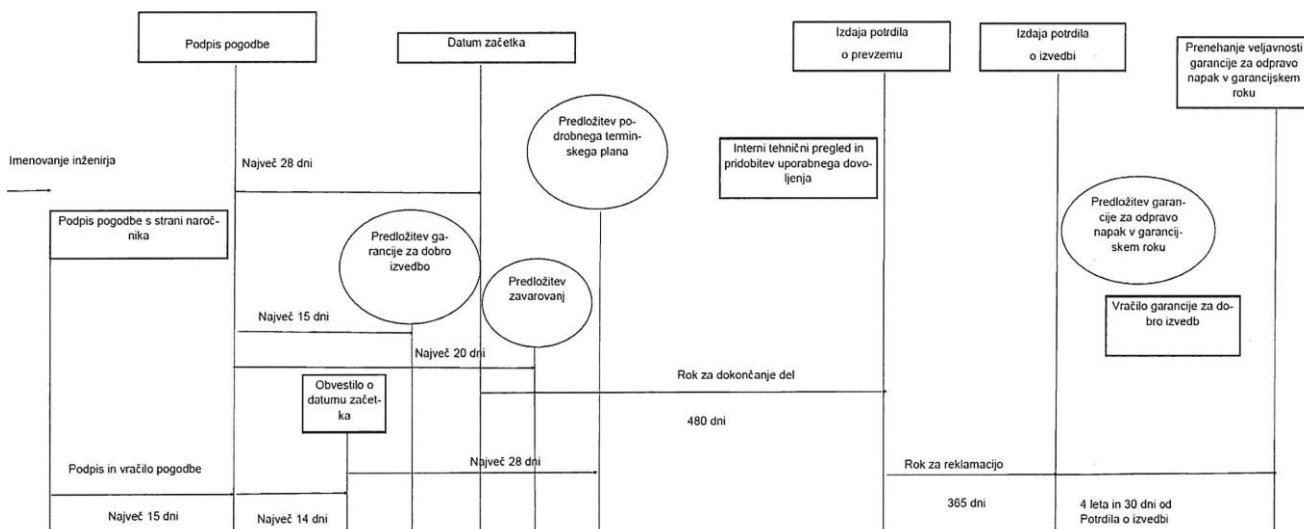

Ponazoritev zaporedja glavnih dogodkov med izvajanjem gradbenih del.



OBČINA RENČE-VOGRSKO

2.2 Vpliv investicije na proračuna 2023 in 2024

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2023 je bilo pod postavko 15002019 – Kanalizacija Renče-Vogrsko – 1. faza predvidenih 2.469.470,86 EUR sredstev, v veljavnem rebalansu proračuna za leto 2024 pa 11.906,00 EUR sredstev.

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2023 je bilo pod postavko 15002019 – Kanalizacija Renče-Vogrsko – 1. faza realiziranih 2.353.949,20 EUR sredstev, v veljavnem rebalansu proračuna za leto 2024 pa 11.201,81 EUR sredstev.

Pri nadzoru vpliva investicije na veljavna proračuna za leti 2023 in 2024 sta bili pregledani kartici finančnega knjigovodstva za postavko 15002019 – Kanalizacija Renče-Vogrsko – 1. faza od 1.1.2023 do 29.11.2024.

Leto 2023:

Konto kartica - konto	partner	dokument	Znesek v EUR (z DDV)
402008 - Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	MOJCA FORNAZARIČ s.p.	PR/23-0793	366,00
		TD/23-0793	-66,00
		PR/23-0981	109,80
		TD/23-0981	-19,80
		PR/23-1148	292,80
		TD/23-1148	-52,80
402099 - Drugi splošni material in storitve	PROGRAF REKLAME d.o.o.	PR/23-1167	156,16
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	AVGUSTA d.o.o.	PR/23-0899	2.912,14
420401 - Novogradnje	KOLEKTOR CPG d.o.o.	PR/23-0153	110.744,74
		TD/23-0153	-19.970,36
		PR/23-0357	130.970,10
		TD/23-0357	-23.617,56
		PR/23-0358	83.194,04
		PR/23-0542	171.668,24
		TD/23-0542	-21.663,75
		PR/23-0726	83.584,51
		TD/23-0726	-15.072,62
		PR/23-0920	236.587,06
		TD/23-0920	-40.161,27
		PR/23-1057	313.305,93
		TD/23-1057	-37.254,47
		PR/23-1207	356.048,16
		TD/23-1207	-62.630,51
		PR/23-1365	251.107,66
		TD/23-1365	-43.685,51
		PR/23-1542	339.894,76
TD/23-1542	-56.588,28		
PR/23-1715	611.779,22		
TD/23-1715	-98.276,75		
	PROJEKT d.d. NOVA GORICA	PR/22-2074	2.642,61



OBČINA RENČE-VOGRSKO

420801 - Investicijski nadzor		TD/22-2074	-476,54
		PR/23-0382	7.512,09
		TD/23-0382	-1.007,78
		PR/23-0745	5.901,61
		TD/23-0745	-849,37
		PR/23-0929	5.470,03
		TD/23-0929	-928,55
		PR/23-1069	7.243,83
		TD/23-1069	-861,35
		PR/23-1395	14.037,81
		TD/23-1395	-2.458,09
		PR/23-1560	7.858,57
		TD/23-1560	-1.308,36
		PR/23-1757	17.202,33
		TD/23-1757	-2.715,90
		PR/23-1842	7.254,43
		TD/23-1842	-1.136,94
	PR/23-1917	2.011,12	
	TD/23-1917	-315,19	
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	IPOD d.o.o.	PR/23-0199	7.027,20
		PR/23-1189	5.734,00
	MOJCA FORNAZARIČ s.p.	PR/23-0268	2.989,00
		TD/23-0268	-539,00
Skupaj:			2.353.949,20

Obremenitev proračuna 2023 je skupaj 2.353.949,20 EUR in ne presega veljavnega proračuna na postavki 15002019 za leto 2023.

Leto 2024:

Konto kartica - konto	partner	dokument	Znesek v EUR(z DDV)
402008 - Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	MOJCA FORNAZARIČ s.p.	PR/23-1980	622,20
		TE/24-0014-DDV	-112,20
		PR/24-0383	2.415,60
		TD/24-0383	-435,60
420801 - Investicijski nadzor	PROJEKT d.d. NOVA GORICA	PR/24-0155	2.226,61
		TD/24-0155	-348,96
		PR/24-0301	2.082,96
		TD/24-0301	-326,45
		PR/24-0412	2.226,61
		TD/24-0412	-348,96
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	HYDROTECH d.o.o.	PR/24-0726	3.904,00
		TD/24-0726	-704,00
Skupaj:			11.201,81

Obremenitev proračuna 2024 je skupaj 11.201,81 EUR in ne presega veljavnega proračuna na postavki 15002019 za leto 2024.



3. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Na podlagi pregledane dokumentacije in pojasnil odgovornih oseb Nadzorni odbor bistvenih nepravilnosti pri vodenju postopkov oddaje javnih naročil ni ugotovil, prav tako ni zaznal nepravilnosti pri uporabi določb internih aktov in ravnanju odgovornih oseb.

Sredstva za financiranje investicije so bila pravočasno zagotovljena v sprejetih rebalansih proračunov za leti 2023 in 2024.

Pripravila: Gregor Kobal in Radovan Rusjan

Gregor Kobal

Predsednik NO

Renče, 20.1.2025
